

8. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
- przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
  - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Eksploatacji Zakładu w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
10. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Rozdzielnię Gazu w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.


**Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma łącznie z mapą ( mapami ) stanowiącą załącznik graficzny.**

**Obowiązujące normy i przepisy:**

- ( 1 ) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- ( 2 ) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640 ).


Z poważaniem

Kierownik  
Rozdzielnia Gazu Kędzierzyn-Koźle

  
Piotr Podolski

Otrzymują:

1. Adresat + mapa
2. a/a

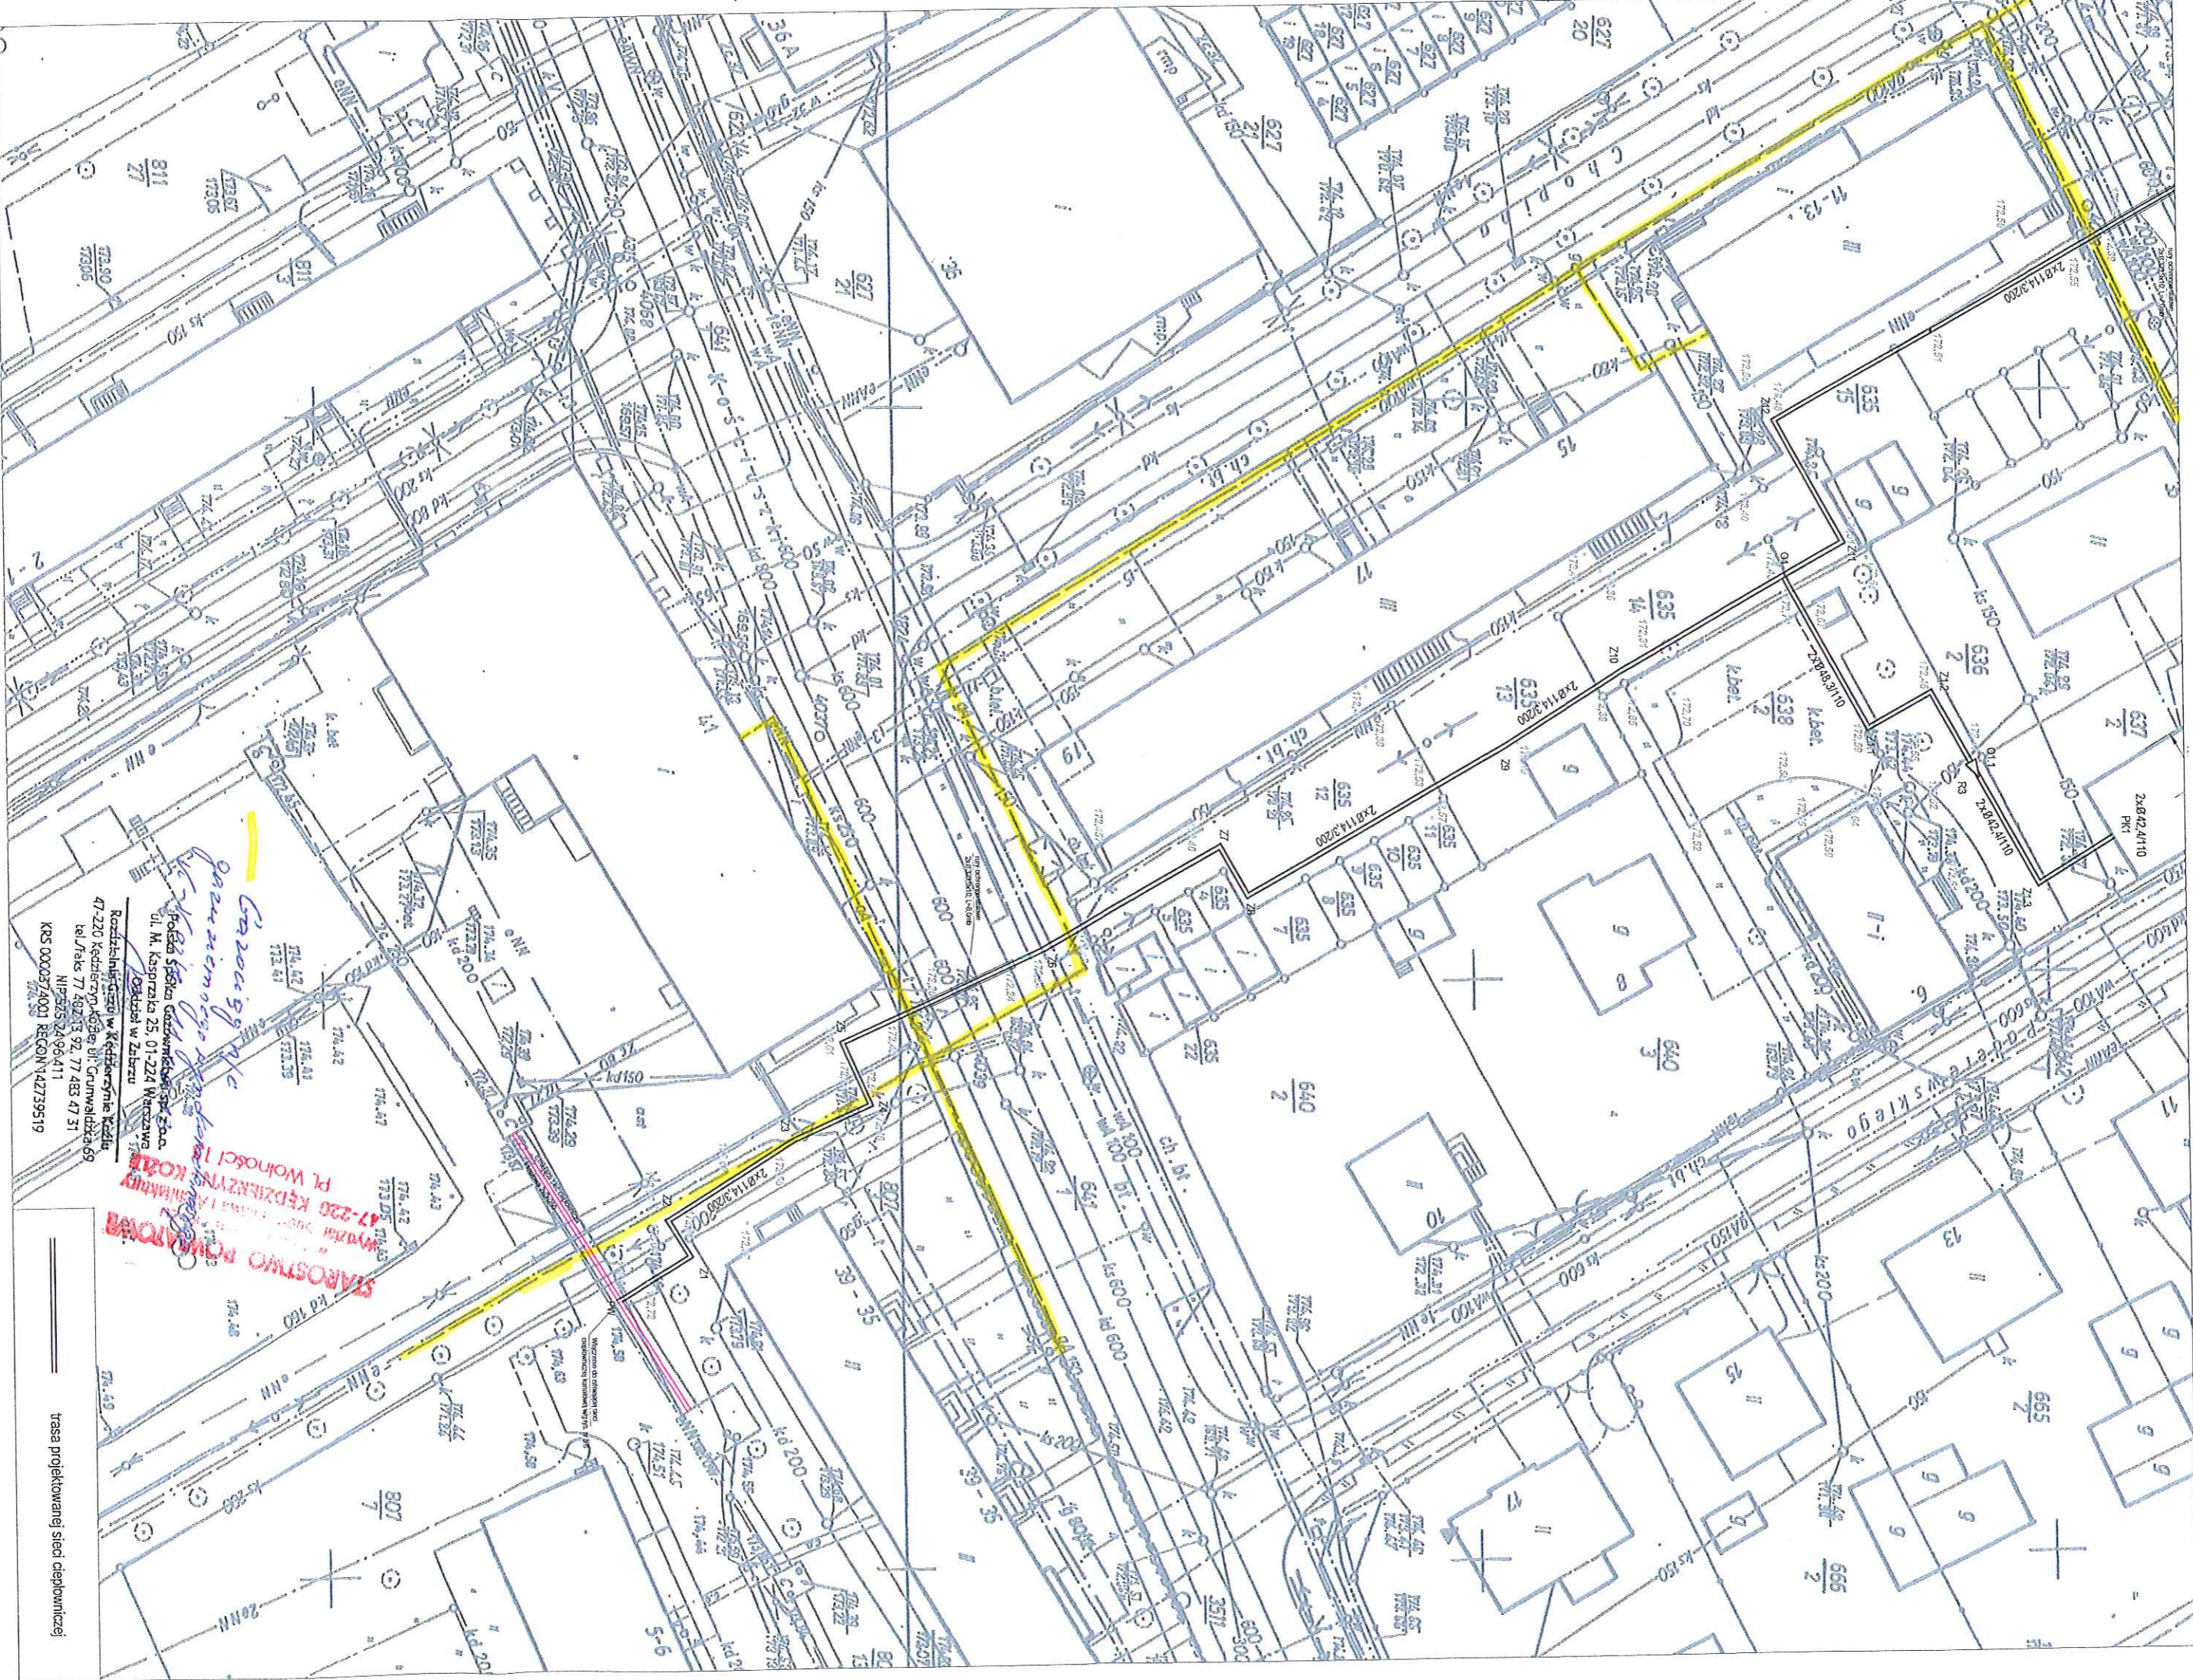

*całkowicie  
głównie nowego projektu*

Rozdzielnicę szereg w Kędzierzynie Koźle  
47-220 Kędzierzyna-Koźle, ul. Grunwaldzka 69  
tel/fax 77 482 713 92, 77 483 47 31  
NIP: 525 2496411  
KRS 0000574001 REGON 142739519

**STAROSTWO POWIATOWE**  
WYDZIAŁ ENERGII I KRAJOWY  
47-220 KĘDZIERZYNA KOŹLE  
Pl. Wolności 18

trasa projektowanej sieci ciepłowniczej


trasa projektowanej sieci ciepłowniczej

**MIĘDZYGOSK**  
w Kędzierzynie-Koźle  
Instal Budowlana i Architekcyjna  
ul. Kędzierzynie-Koźle 13  
14-230 Kędzierzyn-Koźle

*Wzrosty nie gazu  
wymagane  
K-koło*

Poldek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Odsiażnik i Zastępcy

Rezerwa Gazu w Kędzierzynie Koźlu  
W. 479220 Kędzierzyn Koźle, ul. Grunwaldzka 69  
ul. Wolności 71, 483 13 92, 77 483 47 31  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

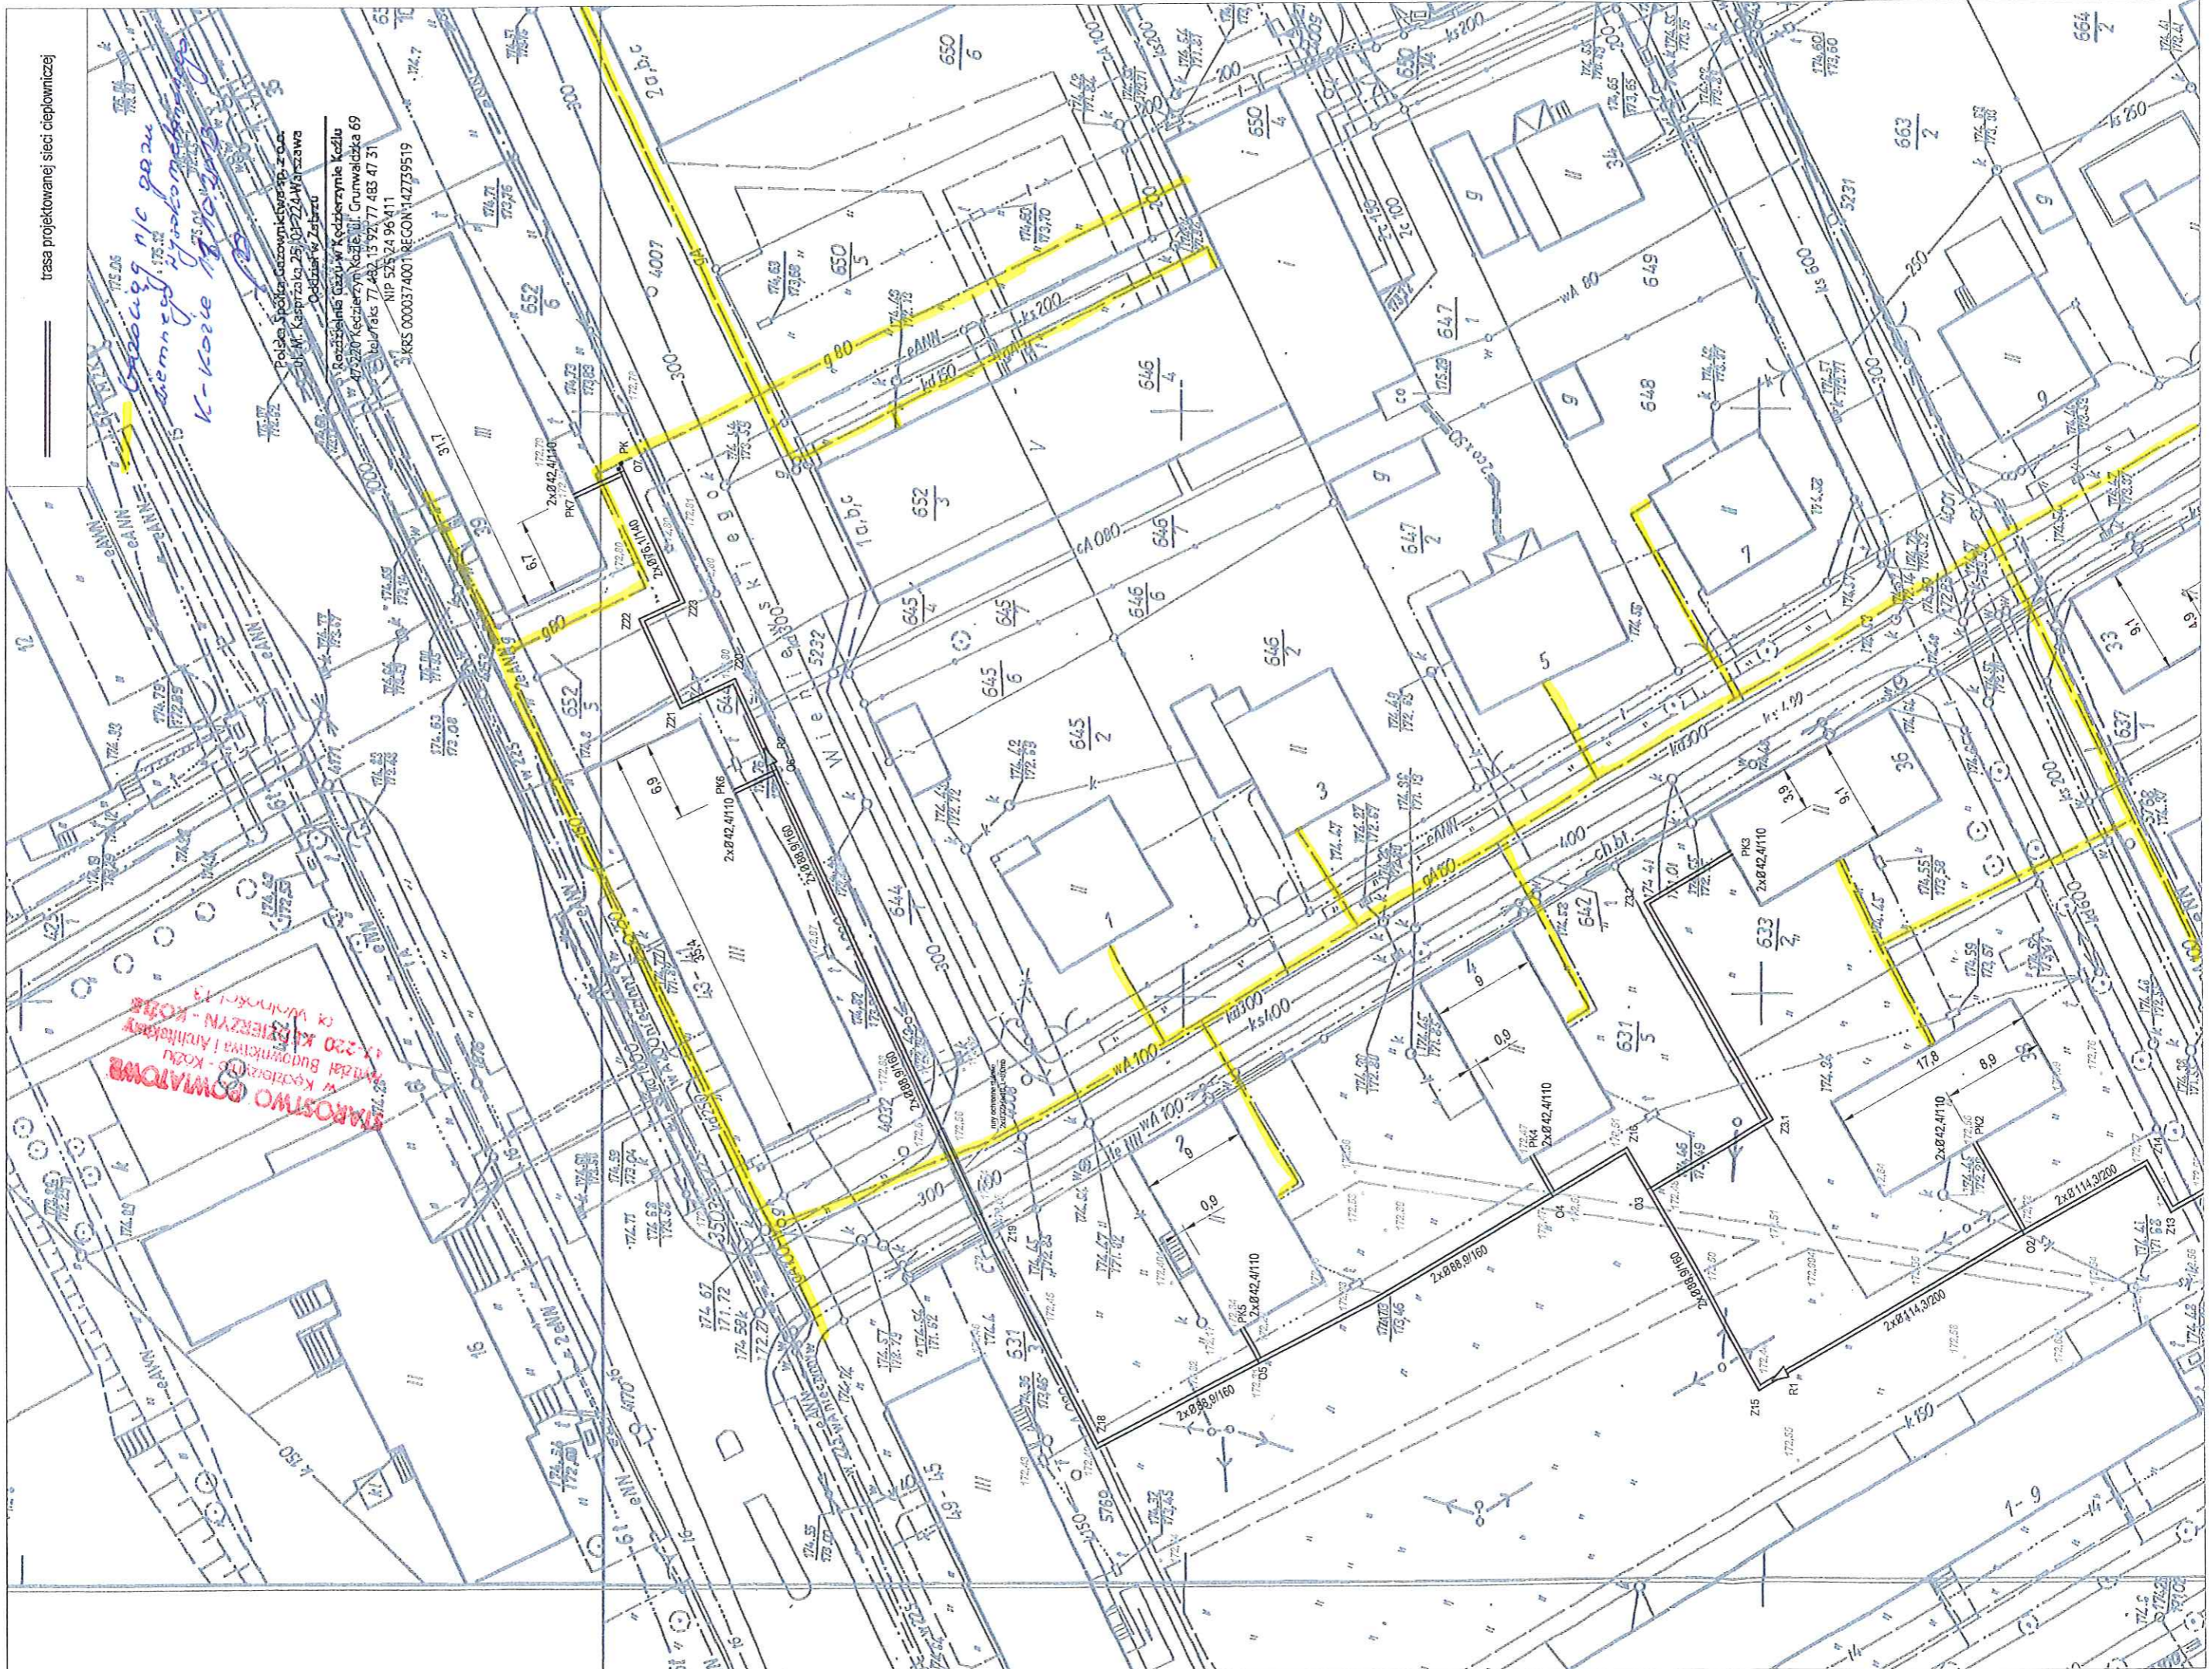



DRP

SEKRETARIAT MZEC Sp. z o.o. W P L Y N Ę Ł O
25 -10- 2013
Nr ewid. .... 2018
Podpis: .....

Telekomunikacja Polska  
Domena Hurt  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice  
Adres do korespondencji:  
ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole  
tel.: 77 455 78 11; fax.: 77 455 20 20

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej  
Spółka z o.o.  
ul. Stalmacha 18  
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Opole, 17 październik 2013r.

Numer pisma: TOTDKA/UK.119284 - 215/2013  
Temat: uzgodnienie branżowe projektowanej sieci ciepłowniczej w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kościuszki, Dębowa, Chopina, Paderewskiego, Ligonja, Kozielska

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kędzierzynie - Koźlu  
Wydział Budownictwa i Architektury  
47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE  
Pl. Wolności 13

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 09.10.2013 (data wpływu do TP – 14.10.2013) w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci ciepłowniczej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kościuszki, Dębowej, Chopina, Paderewskiego, Ligonja i Kozielskiej, Telekomunikacja Polska, Ewidencja i Rozwój Sieci TOK, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice informuje, że w obszarze zamierzeń inwestycyjnych występują urządzenia będące w eksploatacji TP S.A. – kanalizacja teletechniczna (zaznaczona na mapie kolorem pomarańczowym).

W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, wykonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości.

Uzgodnienie ww. dokumentacji jest uwarunkowane spełnieniem następujących wytycznych:

1. Skrzyżowania z kanalizacją teletechniczną, przy odległości  $\leq 0,5m$  zabezpieczyć rurami osłonowymi stosownej średnicy;
2. Prace w obrębie sieci teletechnicznej poprzedzić wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi urządzeń liniowych TP S.A.;
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od domierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego TP S.A.;
4. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z TP S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do TP S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zabezpieczenia lub przebudowy;
5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem branżowym (płatnym) przedstawicieli służb technicznych TP S.A.;
